Plataforma MedIA

Suite de herramientas de IA para automatizar la gestión, producción y distribución de contenidos audiovisuales

Documento de contexto y plan de trabajo del equipo UPV · VRAIN

Proyecto CPP2024-011408 · Convocatoria de Colaboración Público-Privada 2024 (AEI / MICIU), cofinanciado con fondos FEDER de la Unión Europea

Universitat Politècnica de València · VRAIN (Valencian Research Institute for Artificial Intelligence)

Versión 1.0 · 26 de agosto de 2026

Responsable: Jordi Linares-Pellicer, investigador principal del subproyecto UPV

Control de versiones

Versión	Fecha	Autor	Cambios
1.0	26/08/2026	J. Linares (UPV · VRAIN)	Versión inicial: contexto completo del proyecto, estado a agosto de 2026 y plan de trabajo de septiembre a noviembre de 2026.

Documento vivo: se revisará periódicamente y cada revisión añadirá una fila al control de versiones. Es material interno del equipo UPV·VRAIN; de él se extraerán los diagramas y resúmenes que se compartan con el resto del consorcio.

Contenido

1. Propósito de este documento
2. El proyecto MedIA: qué es y qué persigue
3. Plan de trabajo, hitos y entregables
4. Casos de uso y componentes
5. El papel de la UPV y de VRAIN
6. Reuniones celebradas y acuerdos vigentes
7. Dónde está todo: repositorios y accesos
8. Plan de trabajo a partir de septiembre de 2026
9. Arquitectura: de las capas y las APIs a una plataforma nativa de agentes
10. Prototipo objetivo para la plenaria del 29 de septiembre
11. Calendario inmediato (septiembre a noviembre de 2026)
12. Glosario
13. Referencias
Anexo A. Directorio de contactos del proyecto

1. Propósito de este documento

Este documento reúne en un único sitio todo lo que hay que saber para trabajar en el proyecto **Plataforma MedIA** desde el equipo de la UPV en VRAIN: qué es el proyecto y qué persigue, quiénes son los socios, qué plazos y entregables nos afectan, qué se ha hecho ya, qué acordamos en las reuniones del consorcio y, sobre todo, qué vamos a hacer a partir de septiembre de 2026 y con qué enfoque técnico.

Se ha escrito pensando en cualquier persona que se incorpore al trabajo de VRAIN en MedIA o que necesite una fotografía completa y al día. La primera mitad (secciones 2 a 7) es contexto: el proyecto, el consorcio, el calendario y el estado actual. La segunda mitad (secciones 8 a 11) es plan: las tareas de septiembre, la propuesta de arquitectura basada en MCP y agentes abiertos, y el prototipo que queremos llevar a la reunión plenaria del 29 de septiembre. El glosario de la sección 12 explica de forma breve los términos técnicos que van apareciendo.

Es un documento vivo. Se irá revisando conforme avance el proyecto (el control de versiones de la portada registra cada cambio) y servirá también de cantera de diagramas, tablas y argumentos para los materiales que presentemos al resto de socios.

2. El proyecto MedIA: qué es y qué persigue

2.1. La idea en pocas palabras

MedIA es un proyecto de I+D en colaboración público-privada cuyo objetivo es construir una **suite integral de herramientas de IA generativa y multimodal para el contenido audiovisual**: una plataforma única que ayude a producir, gestionar, distribuir y explotar vídeo a organizaciones que no son broadcasters (empresas, administraciones públicas, universidades, medios locales y regionales). La meta declarada en la memoria es democratizar el acceso a la IA audiovisual: cubrir toda la cadena de valor del contenido, desde la guionización hasta la distribución multicanal, reduciendo costes, tiempo y barreras de entrada.

Una decisión estratégica define todo el proyecto: la plataforma se construye sobre **modelos abiertos** que se integran, evalúan y adaptan a cada caso de uso. Esto obliga a diseñar una arquitectura flexible en la que los modelos sean piezas intercambiables, porque el ecosistema de modelos abiertos evoluciona a una velocidad que deja obsoleta cualquier elección cerrada. También hay dos señas de identidad transversales: la atención al **castellano y a las lenguas cooficiales** (un espacio desatendido por las grandes plataformas) y la **accesibilidad** (subtitulado, doblaje, audiodescripción y adaptación automática de contenidos).

La memoria articula el sistema alrededor de cuatro pilares: comprensión contextual profunda (análisis conjunto de vídeo, audio y texto), generación adaptativa en tiempo real, interacción natural mediante un sistema conversacional, y accesibilidad universal inteligente. Al terminar el proyecto, las funcionalidades se integrarán en los productos de las dos empresas del consorcio (la plataforma de vídeo de Watchity y las soluciones OTT y TVHUB de Ebantic) a través de una capa de integración, con un **Sistema Core** desplegable en cloud y multi-tenant, es decir, una única instancia capaz de servir a muchos clientes con datos y configuración aislados.

2.2. Objetivos y alcance funcional

El objetivo principal es esa suite integral; los objetivos específicos se corresponden con los componentes funcionales que hay que construir, agrupados por las tres etapas del ciclo de vida del contenido:

- **Diseño y producción de contenidos:** guionización asistida, optimización de la grabación, generación de imágenes de recurso, generación de vídeo, resúmenes audiovisuales, clips destacados, avatares sintéticos y contenido adaptado a redes y otros canales.

- **Gestión y archivo:** ingesta con enriquecimiento automático (transcripción, diarización, metadatos, etiquetado), indexación y búsqueda semántica sobre todo el archivo, e identificación de personas en el contenido.
- **Distribución y explotación:** subtitulado multilingüe (también en directo), traducción y doblaje sincronizado, audiodescripción, adaptación automática de formatos (16:9, 9:16, 1:1) y personalización del contenido según el perfil de cada usuario, con un asistente conversacional para interactuar con el archivo.

Estos objetivos se concretaron durante la fase de requisitos en **15 casos de uso** y **16 componentes técnicos** con responsables por socio (sección 4). Conviene retener la lógica: los casos de uso describen qué valor se entrega al usuario; los componentes son las piezas de software que lo hacen posible; y los modelos abiertos son el material con el que se construyen los componentes.

2.3. Ficha administrativa

Campo	Valor
Título	Plataforma MedIA: suite de herramientas de IA para automatizar la gestión, producción y distribución de contenidos audiovisuales
Referencia	CPP2024-011408
Convocatoria	Proyectos de Colaboración Público-Privada 2024 (AEI / MICIU), cofinanciación FEDER (UE)
Coordinador	Watchity, SLU (dirección técnica: Gabriel Fernández; coordinación: Albert Rodes)
Socios	Watchity SLU · UPV (VRAIN) · Ebantic Systems SL · Fundació Eurecat
Periodo de ejecución	01/11/2025 a 31/10/2028 (36 meses). Kick-off: 27/01/2026; arranque efectivo de actividad: febrero de 2026
Presupuesto total	1.757.080,24 € (Watchity 32,49 % · Ebantic 26,06 % · Eurecat 22,16 % · VRAIN 19,30 %)
Presupuesto VRAIN	339.034,35 € (PT3: 24.743,64 · PT4: 24.743,64 · PT5: 289.547,22)
Ayuda concedida a la UPV	264.470,00 € (subvención 105.788,00 + anticipo reembolsable FEDER 158.682,00)
Clave específica UPV	20260049 (centro de coste operativo, con los fondos ingresados)
IP del subproyecto UPV	Jordi Linares-Pellicer (VRAIN)

2.4. El consorcio: quién es quién

Socio	Perfil	Aporta al proyecto
Watchity	Empresa (coordinadora), Barcelona	Plataforma de producción y distribución de vídeo para empresas, AAPP y educación. En MedIA: coordinación, transcripción y traducción en directo, diarización propia, VAD semántico, reencuadre 9:16 y la plataforma de streaming sobre la que se apoya todo (C16).
Eurecat	Centro tecnológico (Cataluña)	Resumen audiovisual, audiodescripción, metadatos y detección de objetos, segmentación temática y reconocimiento facial (AuraFace con banco de identidades). Gestiona el repositorio documental común del consorcio.
Ebantic	Empresa, Barcelona	Caso Story-Centric: generación multicanal desde un CMS con núcleo narrativo en JSON, backend Java con LangChain4j y modelos Gemma 3

Socio	Perfil	Aporta al proyecto
		(12B y 4B) servidos con Ollama. Soluciones OTT para museos y TVHUB para medios.
UPV · VRAIN	Universidad (instituto de investigación en IA)	Evaluación y selección de modelos abiertos (tablas y tiers), RAG y bases vectoriales, síntesis de voz, avatares, generación de vídeo, y el liderazgo del PT4 (Sistema Core), incluida la arquitectura de la plataforma y la propuesta de capa MCP adoptada por el consorcio.

El directorio completo de personas y correos está en el Anexo A. Las reuniones de seguimiento son mensuales y quedan recogidas en actas (sección 6); la próxima plenaria es el **martes 29 de septiembre de 2026 a las 09:00** (Google Meet, convoca Albert Rodes).

2.5. Calendario general

El proyecto dura 36 meses, del 1 de noviembre de 2025 al 31 de octubre de 2028. El arranque real de actividad fue en febrero de 2026 (el kick-off se celebró el 27 de enero), y ese desfase inicial de unos meses llevó al consorcio a replanificar de común acuerdo: el PT3 de selección de modelos se extiende hasta el **30 de noviembre de 2026** y el PT4, que lidera VRAIN, arranca de forma efectiva entre agosto y septiembre de 2026. La figura resume el plan por paquetes de trabajo con las fechas de la memoria, las extensiones reales acordadas en actas y los entregables.

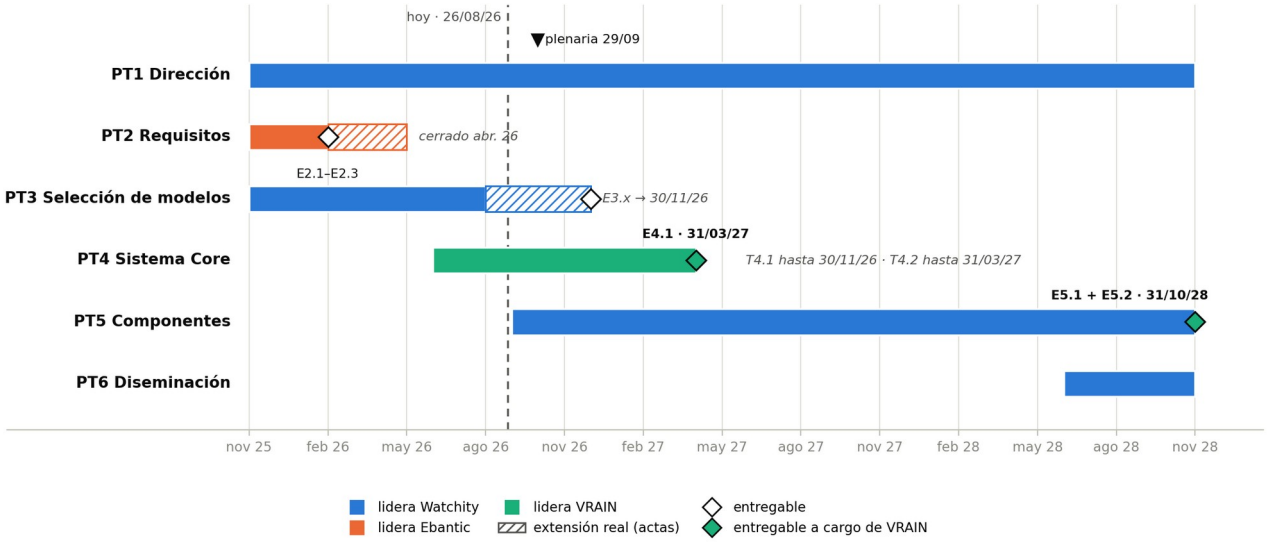


Figura 1. Cronograma del proyecto: paquetes de trabajo (fechas de la memoria), extensiones acordadas en actas (rayado) y entregables. Los rombos rellenos son responsabilidad directa de VRAIN.

3. Plan de trabajo, hitos y entregables

3.1. Paquetes de trabajo

PT	Título	Líder	Fechas (memoria)	Estado real (agosto 2026)
PT1	Dirección del proyecto	Watchity	11/2025 a 10/2028	En curso continuo (actas y cronograma al día)
PT2	Análisis de requisitos	Ebantic	11/2025 a 01/2026	Cerrado en abril de 2026: E2.1 a E2.3 entregados en V2, más casos de uso, arquitectura de requisitos y test vectors
PT3	Evaluación y selección de modelos abiertos	Watchity	11/2025 a 07/2026	Extendido hasta el 30/11/2026. E3.1 avanzado; E3.2 y E3.3 aún casi en plantilla; parte VRAIN pendiente de consolidar
PT4	**Sistema Core y prueba de concepto**	**VRAIN**	06/2026 a 03/2027	Arranca ahora. T4.1 (arquitectura base) hasta el 30/11/2026; compromiso de septiembre: APIs core y prototipo de servidor MCP
PT5	Desarrollo de componentes y optimización del Core	Watchity	09/2026 a 10/2028	Arranca en septiembre de 2026 en ciclos SCRUM por componente; concentra el grueso del esfuerzo de VRAIN
PT6	Diseminación y explotación	Watchity	06/2028 a 10/2028	Futuro

3.2. Entregables

Código	Entregable	Responsable	Fecha	Estado (26/08/2026)
E1.1	Plan del proyecto e informes de seguimiento	Watchity	31/10/28	Vivo (actas mensuales)
E1.2	Plan de gestión de la propiedad intelectual	Watchity	31/10/28	Futuro
E2.1	Requisitos de UX para el prototipo de validación	Ebantic	31/12/25	Entregado (V2, abril 2026)
E2.2	Requisitos de arquitectura	Ebantic	31/12/25	Entregado (V2)
E2.3	Requisitos de componentes	Ebantic	31/01/26	Entregado (V2)
E3.1	Informe de evaluación de modelos para el núcleo de IA generativa	Watchity (participan todos)	31/07/26 → ~30/11/26	En redacción (unas 15.000 palabras); falta la parte VRAIN
E3.2	Informe de evaluación de sistemas de procesamiento en tiempo real	Watchity	31/07/26 → ~30/11/26	Casi en plantilla
E3.3	Informe de evaluación del resto de modelos abiertos	Watchity (participan	31/07/26 → ~30/11/26	Casi en plantilla; falta la parte

Código	Entregable	Responsable	Fecha	Estado (26/08/2026)
		todos)		VRAIN
E4.1	**Sistema core desarrollado**	**VRAIN**	**31/03/27**	Arranca ahora (T4.1 y T4.2)
E5.1	Componentes integrados y validados	Watchity	31/10/28	Futuro
E5.2	**Sistema core optimizado**	**VRAIN**	**31/10/28**	Futuro

Dos lecturas importan aquí. La primera: los dos entregables cuya responsabilidad recae en VRAIN, **E4.1 y E5.2**, son exactamente los del Sistema Core, así que el liderazgo técnico de la plataforma es nuestro. La segunda: la tarea **T4.1 (desarrollo de la arquitectura base, del 01/06/2026 al 30/11/2026)** incluye, según la memoria, el motor de procesamiento multimodal, los primeros modelos generativos integrados, la infraestructura de procesamiento en tiempo real y los protocolos de evaluación con sus métricas. La T4.2 (diciembre de 2026 a marzo de 2027) valida y refina ese núcleo con pruebas piloto. El compromiso concreto adquirido en la reunión del 21 de julio es tener en septiembre el diseño de las APIs core y el prototipado del servidor MCP.

4. Casos de uso y componentes

La tabla de casos de uso se cerró en la reunión del 17 de marzo de 2026 y es la referencia funcional del proyecto: **15 casos de uso** agrupados en cuatro bloques, cada uno con un socio responsable. La versión de referencia está en `Modelos-MedIA.xlsx` (hoja «Casos de Uso») y el detalle original, con actores y prioridades por socio, en `Casos de uso.xlsx` del PT2. Los marcados en negrita son responsabilidad de VRAIN.

ID	Caso de uso	Bloque	Responsable
CU-01	Generación automática de resumen audiovisual	Producción	Eurecat
CU-02	**Generación automática de clips destacados**	Producción	**VRAIN**
CU-09	Adaptación automática de formato (16:9, 9:16, 1:1)	Producción	Watchity
CU-13	Generación Story-Centric multiplataforma desde CMS	Producción	Ebantic
CU-14	**Generación de avatar sintético (presentadores virtuales)**	Producción	**VRAIN**
CU-04	Generación descriptiva de contenido (metadatos, etiquetas, segmentación)	Gestión y archivo	Eurecat
CU-05	**Búsqueda por similitud semántica**	Gestión y archivo	**VRAIN y Watchity**
CU-15	Identificación automática de personas	Gestión y archivo	Eurecat
CU-06	Subtitulado automático multilingüe	Distribución y accesibilidad	Watchity
CU-07	Traducción y adaptación contextual multilingüe	Distribución y accesibilidad	Watchity
CU-08	Generación automática de audiodescripción	Distribución y accesibilidad	Eurecat
CU-12	Subtitulado en directo (streaming)	Distribución y accesibilidad	Watchity

ID	Caso de uso	Bloque	Responsable
CU-16	**Traducción y doblaje sincronizado**	Distribución y accesibilidad	**VRAIN**
CU-10	**Asistente conversacional sobre el contenido**	Interacción y personalización	**VRAIN**
CU-11	**Generación personalizada en formación**	Interacción y personalización	**VRAIN**

4.1. Los 16 componentes (C1 a C16)

Los casos de uso se materializan en 16 componentes técnicos, definidos en el entregable E2.3 y organizados por capas en la arquitectura (sección 9). En el GitLab del proyecto cada componente tendrá su propio repositorio. Los componentes con participación directa de VRAIN van en negrita:

- **Datos y conocimiento:** C1 ingesta de contenidos · C2 repositorio multimedia · C3 base de datos de metadatos · **C6 base de datos vectorial (VRAIN)**.
- **Motores de IA: C4 transcripción y diarización (VRAIN con Watchity)** · C5 análisis semántico · C7 generación de contenidos · C8 traducción y subtitulado · **C9 síntesis de voz (VRAIN)** · C10 análisis visual · **C11 generación audiovisual y avatares (VRAIN)** · **C14 interacción conversacional (VRAIN)**.
- **Aplicación y distribución:** C12 adaptación y distribución multicanal · **C13 personalización (VRAIN)** · C15 interfaz de usuario · C16 plataforma de streaming (Watchity).

El reparto definitivo componente a entidad se gestiona en el repositorio del consorcio (E2.3 y estructura del GitLab); ante cualquier duda, esa es la fuente que manda.

5. El papel de la UPV y de VRAIN

5.1. Responsabilidades formales

Dentro del consorcio, la UPV participa a través de VRAIN con un triple encargo. Primero, la **evaluación y selección de modelos abiertos** en el PT3: mantener el criterio técnico sobre qué modelos usar para cada función, con qué licencia y con qué requisitos de hardware. Segundo, el **liderazgo del PT4**: diseñar y construir la arquitectura del Sistema Core, con la tarea T4.1 en marcha hasta el 30 de noviembre de 2026 y el entregable E4.1 el 31 de marzo de 2027. Tercero, el **desarrollo de componentes en el PT5** desde septiembre de 2026 hasta el final del proyecto, donde se concentra la mayor parte del presupuesto de VRAIN (289.547 € de los 339.034 € totales) y que culmina con el E5.2 (Sistema Core optimizado) en octubre de 2028.

A esas responsabilidades técnicas se suman las de socio: asistir a las reuniones mensuales de seguimiento, contribuir a los entregables E3.x, mantener al día la tabla unificada de modelos, cumplir la justificación económica anual (partes de dedicación en DEDICA y publicidad FEDER/AEI, ya aplicada en las contrataciones) y aportar a los indicadores comprometidos en la memoria, entre ellos **al menos tres publicaciones científicas** derivadas del proyecto. El equipo técnico contratado por la UPV con cargo al proyecto se incorporó a finales de julio de 2026, así que septiembre es el primer mes completo de trabajo con el equipo al completo.

5.2. Lo que VRAIN ha hecho hasta ahora

- **Informes de arranque (febrero 2026).** Dos documentos de referencia: «Retos tecnológicos y estado del arte» y «Oportunidades open source de la Plataforma MedIA», con el análisis por componente, los riesgos (obsolescencia de modelos, calidad en lenguas cooficiales, coste computacional) y las oportunidades de mercado.

- **Catálogo de modelos con tiers (marzo a junio 2026).** Tabla propia de VRAIN por áreas (bases vectoriales, TTS, generación de vídeo, adaptación de contenido, consulta de vídeo, licencias) y clasificación en niveles de calidad. Los resultados de las pruebas (audios TTS, vídeos de avatares, capturas de consultas multimodales) están subidos a la carpeta VRAIN del PT3 en el repositorio común.
- **Demo multimodal y estrategia de arnés agéntico (reunión del 28/05).** Demostración de consulta multimodal de vídeo con Qwen 3.5 Flash y presentación de la estrategia de VRAIN de usar un arnés agéntico sobre los modelos. De esa reunión salió también el acuerdo de evaluar modelos vía plataformas cloud (OpenRouter, Replicate, fal.ai) antes del despliegue definitivo.
- **Resultados de subtitulado y resúmenes optimizados.** Experimentos de optimización de prompts con Gemma 12B sobre los test vectors del proyecto, con resúmenes al 25 % y al 50 % en castellano, catalán e inglés, publicados en la carpeta de ejecución del repositorio común (results_prompt_opt_12B).
- **Arquitectura de la plataforma (reunión del 21/07).** Presentación al consorcio de la propuesta de arquitectura por capas con orquestador y motores de IA, más una visión de producto con maquetas de interfaz, y una propuesta de pila tecnológica. En esa misma reunión el consorcio adoptó el protocolo MCP a propuesta de la UPV (sección 9).
- **Colaboración en diarización e identificación de personas.** Línea conjunta con Watchity (sesión del 15/07): pipeline de detección facial, embeddings e identidades consistentes combinado con transcripción y diarización, para lograr el «quién dice qué, con nombre».

5.3. Selección de modelos abiertos de VRAIN (estado actual)

Resumen de la selección vigente (fichero `SelecciónModelosVrain.xlsx` del PT3, julio de 2026). La tabla unificada del consorcio, con los modelos de todos los socios por caso de uso, es `Modelos-MedIA.xlsx`.

Área	Primera opción	Alternativas evaluadas	Nota
Síntesis de voz (TTS)	Fish Audio S2 (es/ca; licencia CC-BY-NC-SA, atención al uso comercial)	Qwen3-TTS con clonación (Apache-2.0) · Kokoro 82M (Apache-2.0) · Magpie 357M · MOSS-TTS · VibeVoice · OpenVoice v2	Kokoro rinde bien en castellano y flojo en catalán
Consulta multimodal y adaptación (VLM/LLM)	Gemma 4 31B (o 12B)	MiMo-V2.5 (MIT) · Qwen3.5-27B (Apache-2.0) · Lance (ByteDance)	Probados en castellano y catalán con tiempos de respuesta medidos
Generación de vídeo	Kandinsky 5 Pro (MIT)	HunyuanVideo 1.5 · Wan 2.2 A14B (Apache-2.0) · LTX-2 (con audio)	Licencias comunitarias: revisar caso a caso
Avatares	HunyuanVideo-Avatar	LAM (Apache-2.0) · LTX-2 audio-to-video · LongCat Video Avatar 1.5 (MIT)	Vídeos de muestra en la carpeta VRAIN del PT3
Transcripción y diarización	WhisperX (BSD-2)	faster-whisper + pyannote (MIT)	Línea compartida con Watchity
Bases vectoriales y RAG	Qdrant	ChromaDB (prototipado) · pgvector · GraphRAG y variantes en el radar	Sustenta CU-05 y el chat con contenido

Un detalle relevante para la sección 9: la propia hoja de selección enlaza, para casi cada modelo, su proveedor cloud en OpenRouter, fal.ai o Replicate. Son las mismas plataformas acordadas por el consorcio para evaluación rápida, y las mismas que están construyendo el ecosistema de agentes y MCP del que hablaremos después.

6. Reuniones celebradas y acuerdos vigentes

El consorcio se reúne una vez al mes (al principio cada dos). Hasta la fecha se han celebrado ocho reuniones, todas con acta en el repositorio común (carpeta `02- COORDINACIÓN/21 - REUNIONES`). Este es el hilo argumental del proyecto contado a través de ellas:

#	Fecha	Foco y acuerdos principales
1	27/01/26	Kick-off. Watchity coordina; inicio real en febrero; Teams como canal de comunicación del consorcio.
2	24/02/26	Requisitos. Los casos de uso se consolidan en cuatro bloques (producción; gestión y archivo; distribución y accesibilidad; interacción y personalización). Se aplaza la entrega de los primeros entregables.
3	17/03/26	Cierre de requisitos. Tabla definitiva de 15 casos de uso y 16 componentes C1-C16, con responsables por socio. Se acuerda preparar ejemplos y datasets.
4	26/03/26	Replanificación. Se reconoce un retraso de unos cinco meses; el PT3 se desplaza a octubre-noviembre de 2026 y se piden datos de prueba para primeros de abril.
5	28/04/26	Selección de modelos (1). PT2 cerrado; PT4 desplazado a agosto. Se presentan 12 test vectors y se acuerda documentar a dos niveles: un Excel vivo de modelos más los entregables formales E3.x. Se señala la necesidad de ground truth.
6	28/05/26	Selección de modelos (2). Demo de VRAIN de consulta multimodal (Qwen 3.5 Flash) y presentación de su estrategia de arnés agéntico. Arranca la colaboración Watchity-VRAIN en diarización. Se acuerda evaluar modelos vía OpenRouter, Replicate y fal.ai.
7	30/06/26	Selección de modelos (3). VRAIN presenta sus tiers de modelos (Gemma 4 31B en el nivel más alto); Ebantic elige Gemma 3 12B y 4B para Story-Centric; primera arquitectura por capas sobre la mesa; se define la estructura de E3.1 a E3.3.
8	**21/07/26**	**Selección de modelos (4). El consorcio adopta el protocolo MCP a propuesta de la UPV. Se acuerda un GitLab propio del proyecto con un repositorio por componente. Compromiso para septiembre: diseño de APIs core y prototipo de servidor MCP (PT4). Eurecat fija su enfoque de reconocimiento facial (AuraFace con banco de identidades). Validación cualitativa con cuestionarios a usuarios. Próxima plenaria: 29/09.**

6.1. Decisiones vigentes y cuestiones abiertas

- **Documentación a dos niveles:** el Excel vivo de modelos (`Modelos-MedIA.xlsx`) para el día a día y los entregables E3.x como foto formal.
- **Evaluación rápida en cloud:** OpenRouter, Replicate y fal.ai como vía estándar para probar modelos antes de decidir su despliegue definitivo.
- **Protocolo MCP adoptado** como forma de estructurar y exponer los servicios de IA de la plataforma (la propuesta es de la UPV y su desarrollo nos corresponde en el PT4).
- **GitLab del proyecto:** un repositorio por componente; la nomenclatura definitiva quedó pendiente de validación entre los responsables.
- **Cuestiones abiertas:** dónde se despliegan los modelos (GPU y hosting, sin decidir); revisión jurídica del reconocimiento facial (RGPD y AI Act, pendiente); y calendario de justificación económica de la primera anualidad (aún sin comunicar).

7. Dónde está todo: repositorios y accesos

El proyecto tiene un repositorio documental común, gestionado por Eurecat, que es la fuente oficial de actas, entregables, cronograma y materiales; el código vive en el GitLab del proyecto y la comunicación entre socios, en el Teams del consorcio. Si falta alguno de los accesos de la tabla, se solicita al contacto indicado.

Recurso	Qué contiene	Acceso
Repositorio documental del consorcio (Drive «0-Plataforma MedIA EXTERN»)	Fuente oficial: administración (memoria), coordinación (cronograma, participantes, actas y grabaciones), ejecución, entregables y justificación.	Lo comparte Eurecat. Solicitar acceso a Roger Marí (roger.mari@eurecat.org), con copia a Daniel Raya.
Teams del consorcio	Canal de comunicación entre socios (lo abrió Eurecat en febrero de 2026).	Pedir alta a Eurecat o a la coordinación (Watchity) si no se tiene.
GitLab del proyecto	Código del proyecto: un repositorio por componente (C1 a C16), nomenclatura en validación.	Credenciales: Gabriel Fernández (gfernandez@watchity.com).
Tablas de modelos	La tabla unificada del consorcio (Modelos-MedIA.xlsx) y la selección propia de VRAIN (SelecciónModelosVrain.xlsx, en su carpeta VRAIN).	Repositorio común: 05-ENTREGABLES/PT3.
Test vectors (TV01 a TV13)	Trece vídeos reales con subtítulos y transcripciones en varios idiomas, para probar y comparar modelos.	Repositorio común: 05-ENTREGABLES/PT2/Test-Vectors.

Los test vectors incluyen imágenes y voces de personas reales: se tratan como material interno del proyecto, no se suben a servicios externos sin acuerdo y cualquier uso con datos personales respeta lo indicado en la sección 9.6.

8. Plan de trabajo a partir de septiembre de 2026

Septiembre marca el inicio real del PT4 con el equipo al completo, y llega con un compromiso público adquirido el 21 de julio: presentar el diseño de las APIs core y el prototipado del servidor MCP. El plan se organiza en cinco líneas.

8.1. Familiarización con el proyecto

Orden de lectura recomendado para situarse con eficacia:

- Este documento, de principio a fin.
- La memoria técnica del proyecto (`General/01- ADMINISTRACIÓN/Memoria ... vDEF.pdf`): sobre todo los apartados de objetivos, plan de trabajo y entregables.
- Los entregables de requisitos E2.1 a E2.3 y los ficheros `Casos de uso.xlsx` y `Arquitectura.xlsx` del PT2.
- Las actas del 17/03, 30/06 y 21/07 (las tres que más definen el rumbo técnico).
- La presentación de arquitectura de VRAIN (`Presentaciones VRAIN/Arquitectura proyecto.pdf`) y su dosier de preparación.
- Las tablas de modelos (`Modelos-MedIA.xlsx` y `SelecciónModelosVrain.xlsx`) y un vistazo a los resultados de la carpeta VRAIN del PT3.

En paralelo, cerrar los accesos de la sección 7 (repositorio documental, Teams y GitLab) y las obligaciones internas UPV que estén pendientes (cursos obligatorios, DEDICA).

8.2. Retomar la documentación de entregables

La obligación más inmediata del PT3 es consolidar la **parte VRAIN del E3.1** (evaluación de modelos del núcleo generativo: VLM y consulta multimodal, TTS, avatares, generación de vídeo, RAG y bases vectoriales) y la del **E3.3** (resto de modelos abiertos). El material bruto ya existe (tiers, capturas, audios y vídeos de la carpeta VRAIN del PT3); el trabajo es convertirlo en texto de informe con metodología, resultados y recomendación. También hay que repasar que la tabla unificada `Modelos-MedIA.xlsx` recoja todos los modelos seleccionados por VRAIN. Meta interna: llevar el borrador VRAIN a la plenaria del 29/09; la fecha replanificada del consorcio es el 30/11/2026.

8.3. Repositorio común de modelos abiertos

Necesitamos un catálogo único y vivo de todos los modelos abiertos relacionados con el proyecto, que hoy están repartidos entre varios Excel y carpetas. La propuesta es doble. Primero, un **repositorio git «media-models»** con una ficha por modelo (tarea, licencia y su implicación comercial, idiomas, hardware necesario, proveedor cloud en OpenRouter, fal.ai o Replicate, estado de prueba, casos de uso a los que sirve y enlaces), generando la tabla resumen a partir de las fichas. Segundo, una **organización en Hugging Face** para alojar los pesos que adaptemos o afinemos nosotros (voces, LoRA, cuantizaciones), de modo que cualquier socio pueda reproducir los resultados. El Excel unificado del consorcio se mantiene: este catálogo es la trastienda técnica de VRAIN que lo alimenta.

8.4. Repositorio de pruebas y experimentos

El código oficial de los componentes vivirá en el GitLab del proyecto (un repositorio por componente, acuerdo del 21/07). Para el trabajo exploratorio de VRAIN proponemos además un **repositorio de experimentación** (GitHub del grupo) con esta estructura:

- `experiments/CU-xx-tema/` una carpeta por experimento, ligada al caso de uso al que sirve, con README (objetivo, modelo, datos, resultados, conclusión) y código reproducible.
- `mcp-servers/` los servidores MCP que vayamos construyendo (empezando por el del prototipo de la sección 10).
- `notebooks/` cuadernos de evaluación y comparativas de modelos.
- `docs/` decisiones técnicas y plantilla de resultados, para que cada prueba deje rastro reutilizable en los E3.x.

Regla de oro: los test vectors y cualquier material con datos personales no salen del repositorio oficial del consorcio; en el repositorio de experimentos se referencian por identificador (TV01, TV02…). Cuando un experimento madura hacia componente, se migra o espeja al GitLab oficial con la nomenclatura acordada.

8.5. T4.1: arquitectura y servidor MCP

La quinta línea es la principal y tiene sección propia: convertir la propuesta de arquitectura presentada en julio en el diseño de referencia del Sistema Core, con las APIs core y la capa MCP como primer resultado tangible, y con una evolución hacia agentes abiertos que se detalla a continuación.

9. Arquitectura: de las capas y las APIs a una plataforma nativa de agentes

9.1. Punto de partida: la arquitectura presentada al consorcio

La propuesta que VRAIN presentó el 21 de julio (fichero `Presentaciones VRAIN/Arquitectura proyecto.pdf`) define una plataforma modular por capas. Sobre la plataforma de streaming existente (C16) se apoyan el bloque de datos y conocimiento (ingesta, repositorio multimedia, metadatos y base vectorial) y el bloque de **motores de IA** (transcripción y diarización, análisis semántico, generación de contenidos, traducción, síntesis de voz, análisis visual e interacción conversacional). Dos decisiones de diseño sostienen el conjunto: cada motor **abstrae su implementación** (puede ser una API externa, un modelo abierto alojado por nosotros o un modelo propio, intercambiables sin tocar el resto), y un **orquestador de IA** decide qué motores se invocan para cada petición. Por encima, los servicios de aplicación (los 15 casos de uso), el backend con sus APIs y la interfaz de usuario. La pila tecnológica recomendada como punto de partida: Next.js, FastAPI en Python, Celery con Redis (y Temporal con RabbitMQ como evolución), PostgreSQL, MinIO o S3 para el multimedia, Qdrant como base vectorial y FFmpeg para el procesado audiovisual.

Aquella presentación ya incluía, como extra, una interfaz conversacional basada en MCP. Lo que sigue lleva esa semilla a su consecuencia natural: hacer de MCP y de los agentes la forma primaria de acceso a la plataforma, no un añadido.

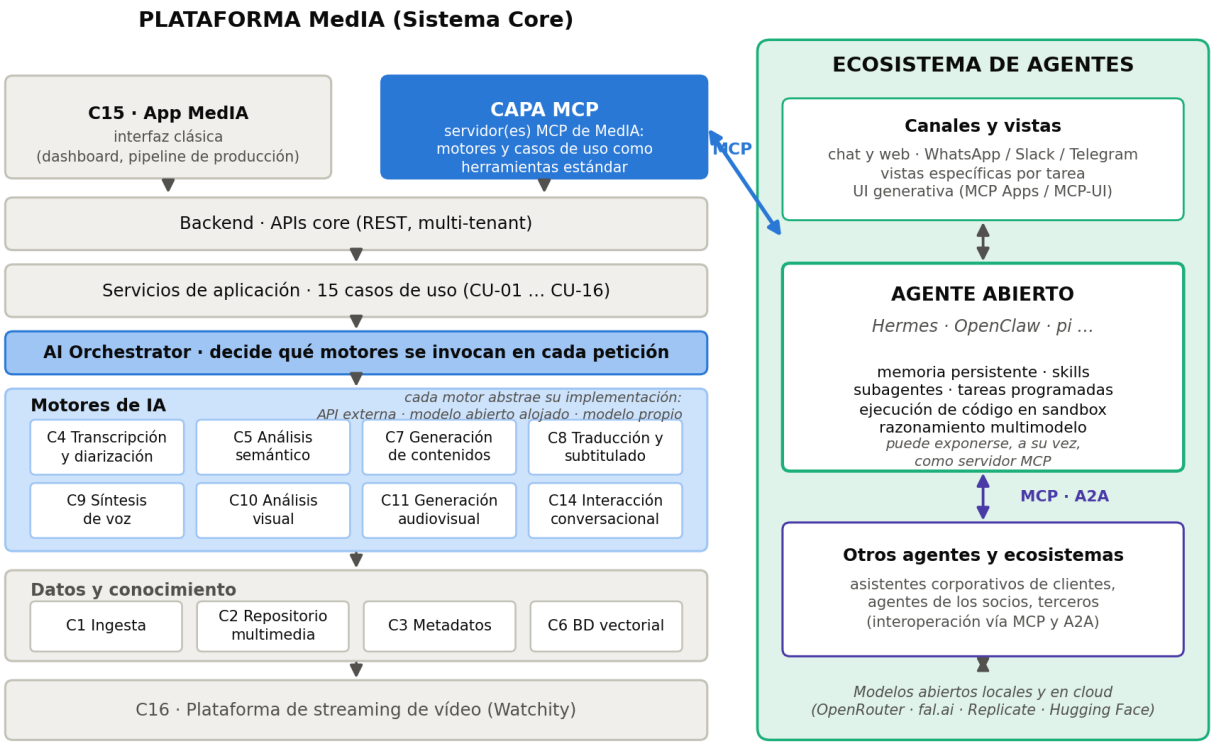


Figura 2. Arquitectura objetivo: la plataforma por capas expone sus motores y casos de uso como herramientas MCP; un agente abierto los orquesta y los acerca a usuarios, canales y otros ecosistemas (vía MCP y A2A).

9.2. Por qué MCP, y en qué punto está

MCP (Model Context Protocol) es el protocolo abierto que estandariza cómo un modelo o un agente de IA descubre y usa herramientas, recursos y prompts de un sistema externo. La analogía habitual lo llama el «USB-C de las aplicaciones de IA»: quien expone un servidor MCP puede ser usado por cualquier cliente compatible, sin integración a medida. Lo impulsó Anthropic a finales de 2024 y hoy es el estándar de facto de la industria: la especificación vigente (2026-07-28) hace el protocolo sin estado y apto para infraestructura convencional con balanceadores, formaliza las tareas de larga duración como extensión oficial y endurece la autorización; sus SDK suman cientos de millones de descargas mensuales y está soportado por las grandes plataformas cloud. Existe además la extensión **MCP Apps**, que permite a una herramienta devolver interfaces interactivas y no solo texto, y un ecosistema paralelo (MCP-UI) alrededor de la misma idea.

Para MedIA, exponer los motores y casos de uso como herramientas MCP tiene tres consecuencias. Dentro de la plataforma, el asistente conversacional (CU-10) deja de ser un desarrollo a medida y pasa a ser un agente que usa las mismas herramientas que todo lo demás. Hacia fuera, cualquier ecosistema de agentes (el copiloto corporativo de un cliente, los productos de Watchity y Ebantic, un asistente de escritorio) puede usar MedIA sin integración específica. Y de cara al mantenimiento, el contrato de cada herramienta es estable aunque el modelo que la implementa cambie, que es exactamente la filosofía de motores intercambiables de la arquitectura.

9.3. La propuesta: un agente abierto como orquestador de la plataforma

La propuesta para septiembre es ir un paso más allá de la arquitectura por capas con APIs: adoptar además un **agente abierto** que concentre los servidores MCP del proyecto y ejerza de orquestador conversacional de la plataforma. Los arneses de agente actuales (agent harnesses) han madurado de forma espectacular y ofrecen de serie capacidades que hace un año exigían desarrollo propio: memoria persistente entre sesiones, generación y reutilización de habilidades (skills), subagentes aislados para tareas largas, tareas programadas, ejecución de código en sandbox para resolver pasos imprevistos, razonamiento con varios modelos (uno potente en cloud

para planificar, modelos locales para el trabajo repetitivo) y presencia multicanal (web, WhatsApp, Slack, Telegram, correo). Candidatos concretos, todos open source:

Agente	Qué ofrece	Encaje en MedIA
Hermes (Nous Research)	Agente autoalojado con licencia MIT: memoria persistente que aprende de cada proyecto, generación automática de skills, subagentes con sus propios entornos, tareas programadas en lenguaje natural, visión, navegación web y cinco backends de ejecución aislada (local, Docker, SSH, Modal…). Multicanal: Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal, correo y CLI.	Candidato principal para el orquestador de referencia y para la demo de septiembre; es el arnés con el que más experiencia tenemos en el grupo.
OpenClaw	El agente personal open source más popular (proyecto de Peter Steinberger, antes Clawdbot/Moltbot): pasarela de canales de mensajería, más de un centenar de skills, cron, webhooks y memoria en Markdown. Comunidad enorme.	Alternativa para la demo y referencia de patrón de canales; su historial aconseja un despliegue endurecido y con permisos mínimos.
pi (pi.dev)	Arnés minimalista de Mario Zechner: el núcleo de agente más pequeño y legible del mercado, pensado para entender y controlar cada pieza.	Ideal para prototipos controlados, docencia interna del patrón y para experimentos donde queramos el arnés desnudo.

La pieza final de la propuesta es la interoperabilidad de salida: el propio agente de MedIA puede exponerse, a su vez, **como servidor MCP** (de modo que otras aplicaciones lo usen como una herramienta más) o comunicarse con otros agentes mediante **A2A (Agent2Agent)**, el protocolo de comunicación entre agentes que Google donó a la Linux Foundation y que ya está en versión 1.0 estable con más de 150 organizaciones detrás. Con MCP hacia dentro y MCP o A2A hacia fuera, MedIA queda conectable con cualquier ecosistema presente o futuro sin rehacer nada.

9.4. Interfaces: de las vistas fijas a la interfaz que se adapta

Este enfoque cambia también cómo entendemos la interfaz. La app MedIA clásica (el dashboard y el pipeline de producción de las maquetas) sigue existiendo para el trabajo profesional estructurado. Pero sobre el agente pueden construirse **vistas específicas por tarea**: herramientas sencillas con interfaz concreta (por ejemplo, «subtitula y dobla este vídeo») que por debajo invocan las mismas herramientas MCP. Y un paso más allá, la extensión MCP Apps permite que las propias herramientas devuelvan widgets interactivos, de forma que el agente pueda **levantar interfaces adaptadas al usuario y al momento**: un formulario de revisión de subtítulos cuando toca revisar, un selector visual de clips cuando toca elegir. Esa flexibilidad conecta directamente con el pilar de personalización del proyecto (CU-11) y con la idea de la memoria de adaptar la experiencia a cada perfil.

9.5. El mercado valida la dirección

No proponemos nada exótico: los proveedores de modelos generativos están convergiendo exactamente en este patrón. **Higgsfield** ofrece un servidor MCP oficial («AI image and video generation for any agent») que da acceso a más de 16 modelos de vídeo e imagen (Kling, Veo, Sora, Seedance, Wan…) desde cualquier agente compatible, además de una CLI y skills preparadas. **fal.ai**, una de las plataformas que ya usamos para evaluación, lanzó en agosto de 2026 su **fal Agent**: un agente creativo que orquesta los mejores modelos de imagen, vídeo y 3D manteniendo memoria y consistencia de proyecto, con servidor MCP anunciado. Replicate y Hugging Face disponen igualmente de servidores MCP oficiales. La lectura estratégica para el consorcio: igual que estos servicios son «el agente creativo» de la generación visual, MedIA puede ser **el agente audiovisual del contenido corporativo, educativo y de medios**, con tres ventajas propias: modelos abiertos intercambiables, calidad en castellano y lenguas cooficiales, y despliegue controlado (importante para el sector público).

9.6. Gobernanza, seguridad y cautelas

- **Permisos y auditoría desde el diseño:** cada herramienta MCP se publica con autenticación por cliente, permisos por herramienta y registro de invocaciones. El agente opera con mínimo privilegio y su ejecución de código va siempre en sandbox.
- **Prudencia con los agentes autoalojados:** la popularidad de estos arneses ha venido acompañada de incidentes de seguridad por despliegues descuidados. Cualquier instancia del proyecto se despliega endurecida, sin exponer credenciales ni datos de socios, y los experimentos con datos reales se hacen con los test vectors y dentro de las normas del consorcio.
- **Legal:** la identificación de personas (CU-15) sigue pendiente de revisión jurídica (RGPD y AI Act); los embeddings faciales son datos biométricos y ese componente no se compromete a producto sin ese análisis. La decisión de GPU y hosting también sigue abierta y condiciona qué modelos se sirven en local.
- **Expectativas:** todo lo anterior se presenta al consorcio como propuesta de VRAIN a validar, alineada con los entregables ya comprometidos; no comprometemos fechas de producto ni alcance que no controlemos.

9.7. Qué llevar a la plenaria del 29 de septiembre

La propuesta concreta a los socios, en cuatro puntos:

- El diseño de las APIs core y de la capa MCP como primer resultado del T4.1 (el compromiso de julio, cumplido).
- La demo del prototipo (sección 10): casos de uso reales del proyecto funcionando a través de un servidor MCP dentro de un agente abierto.
- La propuesta de adoptar un agente abierto como orquestador de referencia del Sistema Core, con Hermes como candidato inicial y evaluación comparativa documentada.
- La hoja de ruta: qué herramientas MCP se construyen por cada caso de uso en los ciclos de PT5, y cómo esto refuerza (sin sustituir) los entregables E4.1 y E5.2.

10. Prototipo objetivo para la plenaria del 29 de septiembre

10.1. Concepto

Una demostración de extremo a extremo con material real del proyecto: un **servidor MCP de MedIA** que encapsula varios de los modelos abiertos ya evaluados por VRAIN, montado dentro de un agente abierto (Hermes como primera opción; OpenClaw o pi como alternativa). El guion que queremos poder ejecutar en directo, en el chat del agente:

> *«Coge la rueda de prensa TV01: transcríbela, hazme un resumen ejecutivo, propón tres clips destacados con sus tiempos, redacta una nota para redes y léeme el resumen con voz en valenciano.»*

Con esa única petición el agente encadena transcripción, resumen, selección de clips, generación de texto y síntesis de voz: exactamente la orquestación de motores que describe la arquitectura, y con casos de uso del proyecto (CU-01, CU-02, CU-04, CU-05, CU-16) sobre los test vectors oficiales.

10.2. Herramientas del servidor MCP (candidatas)

Herramienta	Qué hace	Modelo de partida	Caso de uso
`media_transcribe`	Transcripción con marcas de tiempo (y hablantes si procede)	WhisperX o faster-whisper (+ pyannote)	CU-06 · C4
`media_summarize`	Resumen estructurado del vídeo a	Gemma 4 (12B/31B) o	CU-01

Herramienta	Qué hace	Modelo de partida	Caso de uso
	partir de la transcripción	Qwen3.5-27B, local o vía OpenRouter	
`media_clips`	Propuesta de clips destacados con tiempos y justificación	El mismo VLM/LLM con los prompts optimizados ya probados	CU-02
`media_search`	Búsqueda semántica sobre las transcripciones de TV01 a TV13	Embeddings + Qdrant (o Chroma para el prototipo)	CU-05 · C6
`media_tts`	Síntesis de voz del resultado (castellano y valenciano)	Qwen3-TTS o Kokoro, en local o vía fal.ai / Replicate	CU-16 · C9
`media_avatar` *(opcional)*	Avatar breve presentando el resumen	LTX-2 o HunyuanVideo-Avatar vía fal.ai	CU-14 · C11

Criterio de alcance: mejor tres herramientas sólidas que seis frágiles. El avatar es el extra espectacular si el resto va sobrado; la búsqueda semántica es la más agradecida para enseñar en directo porque responde al momento.

10.3. Plan de septiembre, semana a semana

Semana	Objetivo	Resultado verificable
1 a 7 sept.	Arranque: accesos (repositorio, GitLab, claves de OpenRouter/fal/Replicate), creación del repositorio de experimentos, esqueleto del servidor MCP (SDK de Python) y elección definitiva de las herramientas de la demo.	Servidor MCP «hola mundo» invocable desde un cliente
8 a 14 sept.	Herramientas de transcripción, resumen y clips operativas sobre los test vectors; indexación de TV01 a TV13 para la búsqueda semántica.	Las cuatro herramientas base pasan pruebas con TV01 y TV05
15 a 21 sept.	Integración en el agente (Hermes; plan B: OpenClaw o pi), síntesis de voz, memoria y skill de la demo. Ensayo interno el día 21 o 22.	Guion completo ejecutado de principio a fin en el agente
22 a 28 sept.	Pulido, medición de tiempos, guion definitivo, tres diapositivas de apoyo y plan B en vídeo grabado por si falla el directo.	Demo ensayada y grabada; materiales listos
29 sept.	**Plenaria: demo en directo y propuesta de arquitectura (sección 9.7).**	**Feedback del consorcio y acuerdos**

Todo lo que produzca el prototipo se reaprovecha: las capturas y métricas alimentan los E3.x, el contrato de las herramientas es el primer borrador de las APIs del T4.1, y la experiencia completa (arnés agéntico más MCP sobre vídeo largo en lenguas cooficiales) es candidata firme a primera publicación científica del proyecto.

11. Calendario inmediato (septiembre a noviembre de 2026)

Fecha	Hito
1 de septiembre	Arranque del plan: accesos, repositorio de experimentos, esqueleto del servidor MCP.
8 de septiembre	Primeras herramientas MCP funcionando sobre los test vectors.
15 de septiembre	Integración en el agente abierto; ensayo interno hacia el día 21 o 22.
29 de septiembre, 09:00	**Reunión plenaria del consorcio (Meet): demo del prototipo, propuesta de arquitectura y estado de la parte VRAIN de los E3.x.**
Primera quincena de octubre	Cierre de los borradores VRAIN de E3.1 y E3.3; tabla unificada de modelos al día.
Octubre	Gestión interna UPV: mover con Gestión I+D la prórroga de los contratos del equipo (vencen a finales de noviembre) y revisar el calendario de justificación de la primera anualidad.
30 de noviembre	**Fecha replanificada del consorcio para E3.1 a E3.3 y fin de la tarea T4.1 (arquitectura base documentada del Sistema Core).**
Diciembre a marzo de 2027	T4.2: validación y refinamiento del Sistema Core, hacia el entregable E4.1 (31/03/2027, responsabilidad de VRAIN).

Las reuniones mensuales de seguimiento continúan con normalidad; la lista operativa de tareas al día vive en TO DO/TODO-actual.md y se regenera cada lunes.

12. Glosario

Términos que aparecen a lo largo del documento, explicados en corto y en el contexto de MedIA:

Término	Qué significa aquí
Modelo abierto	Modelo de IA cuyos pesos pueden descargarse y ejecutarse (con su licencia). El proyecto se construye sobre ellos para poder sustituirlos cuando aparezcan mejores opciones.
VLM	Modelo de lenguaje con visión (Vision-Language Model): entiende imágenes o vídeo además de texto. Base de la consulta multimodal de contenidos.
TTS	Síntesis de voz (Text-to-Speech). Con clonación, además, imita una voz de referencia.
Diarización	Separar el audio por hablantes (quién habla y cuándo), sin identificarlos todavía. Combinada con la identificación facial da el «quién dice qué, con nombre».
Embedding	Representación de un texto, imagen o rostro como vector numérico, de modo que cosas parecidas quedan cerca. Es la base de la búsqueda semántica y del reconocimiento.
Base de datos vectorial	Almacén optimizado para buscar por similitud entre embeddings (Qdrant, Chroma, pgvector). Componente C6.
RAG	Generación aumentada por recuperación: antes de responder, el sistema recupera los fragmentos relevantes del archivo y el modelo genera la respuesta apoyándose solo en ellos, con citas.
Fine-tuning / LoRA	Adaptar un modelo preentrenado a un dominio con datos propios; LoRA es la técnica ligera habitual para hacerlo sin reentrenar todo el modelo.
Tier (de modelos)	Nivel de calidad asignado en nuestra evaluación comparativa: tier 1 es la opción recomendada para una función.

Término	Qué significa aquí
Test vector	Vídeo real de prueba del proyecto (TV01 a TV13), con transcripciones y subtítulos de referencia en varios idiomas, para evaluar modelos de forma comparable.
Agente (de IA)	Sistema que usa un modelo de lenguaje en un bucle de observar, planificar y actuar mediante herramientas, en lugar de limitarse a responder texto.
Arnés de agente (harness)	El armazón de software alrededor del modelo: gestión de herramientas, memoria, canales, permisos y ejecución. Hermes, OpenClaw y pi son arneses abiertos.
Skill	Paquete de instrucciones y recursos que enseña a un agente a hacer una tarea concreta de forma repetible. Los arneses modernos las generan y reutilizan.
MCP	Model Context Protocol: estándar abierto para que agentes y aplicaciones descubran y usen herramientas y datos de otros sistemas. La capa MCP de MedIA expone los motores de la plataforma.
Servidor / cliente MCP	El servidor publica las herramientas (MedIA); el cliente las consume (el agente, un IDE, un copiloto corporativo).
MCP Apps / MCP-UI	Extensión y ecosistema que permiten a una herramienta MCP devolver interfaces interactivas (widgets), no solo texto. Vía para la interfaz generativa.
A2A	Agent2Agent: protocolo estándar (Linux Foundation) para que agentes de distintos fabricantes colaboren entre sí. Complementa a MCP: MCP conecta agentes con herramientas; A2A conecta agentes entre ellos.
Orquestador	La pieza que decide qué motores o herramientas se invocan, en qué orden y con qué implementación, para cada petición.
Multi-tenant	Una única instancia de la plataforma sirviendo a varios clientes con datos, permisos y configuración aislados.
Sistema Core	El núcleo tecnológico de MedIA (PT4): motor multimodal, motores generativos, procesamiento en tiempo real y sus métricas de evaluación.
PT / E / CU / C	Paquete de trabajo, entregable, caso de uso y componente, con su numeración oficial (PT4, E4.1, CU-02, C6…).
AEI / MICIU / FEDER	Agencia Estatal de Investigación, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y Fondo Europeo de Desarrollo Regional: el marco de financiación del proyecto.
DEDICA	Aplicación UPV de partes de dedicación: cada miembro del equipo firma mensualmente las horas imputadas al proyecto; es requisito de la justificación.

13. Referencias

13.1. Documentación interna del proyecto

- `General/01- ADMINISTRACIÓN/Memoria ... WATCHITY vDEF.pdf` memoria técnica de referencia (objetivos, PT, entregables, presupuesto).
- `General/02- COORDINACIÓN/` cronograma, participantes y las ocho actas de reunión con grabaciones.
- `General/05- ENTREGABLES/` E2.x finales, E3.x en redacción, casos de uso, arquitectura de requisitos, test vectors y tablas de modelos.
- `Presentaciones VRAIN/Arquitectura proyecto.pdf` propuesta de arquitectura y visión de producto presentada el 21/07/2026, con su dosier de preparación.

- `Revisión estado del arte y posibilidades/` informes VRAIN de febrero de 2026 (retos tecnológicos y oportunidades open source).
- `_Gestión/` y `TO DO/` análisis de gestión al día y lista operativa semanal.

13.2. Referencias externas

- Model Context Protocol — sitio oficial del protocolo; especificación vigente 2026-07-28 y hoja de ruta en el blog oficial.
- MCP Apps (extensión oficial) — interfaces interactivas devueltas por herramientas MCP; ecosistema relacionado en mcpui.dev.
- Agent2Agent (A2A), Linux Foundation — protocolo de comunicación entre agentes; versión 1.0 estable, más de 150 organizaciones.
- Hermes Agent (Nous Research) — agente abierto (MIT) con memoria persistente, skills, subagentes y multicanal.
- OpenClaw — agente personal open source con pasarela de canales de mensajería y catálogo de skills.
- pi — arnés de agente minimalista de Mario Zechner (badlogic/pi-mono).
- Higgsfield MCP — generación de imagen y vídeo (16+ modelos) expuesta como servidor MCP para cualquier agente, con CLI y skills.
- fal Agent — agente creativo de fal.ai (agosto de 2026) que orquesta modelos de imagen, vídeo y 3D con memoria de proyecto; servidor MCP anunciado.
- OpenRouter, Replicate y Hugging Face — plataformas de acceso a modelos usadas en la evaluación; las tres disponen de integración MCP.

Anexo A. Directorio de contactos del proyecto

Entidad	Persona	Rol en el proyecto	Correo
Watchity	Albert Rodes	Coordinación general; convoca las reuniones de seguimiento	arodes@watchity.com
Watchity	Gabriel Fernández	Dirección técnica; actas, cronograma y GitLab del proyecto	gfernandez@watchity.com
Watchity	Sergi Genovès	Equipo técnico y producto	sgenoves@watchity.com
Watchity	Omar Ould el Jebli	Transcripción, diarización y tiempo real	oouldeljebli@watchity.com
Watchity	Francesc Pinyol	Ingeniería senior	fpinyol@watchity.com
Eurecat	Daniel Raya	Gestión del proyecto en Eurecat	daniel.raya@eurecat.org
Eurecat	Roger Marí	Referente técnico; repositorio documental común	roger.mari@eurecat.org
Eurecat	Stefan Hristov	Audiodescripción y modelos de visión	stefan.hristov@eurecat.org
Eurecat	Tim Schmele	Resumen audiovisual	tim.schmele@eurecat.org
Eurecat	Umut Sayin	Audio	umut.sayin@eurecat.org
Ebantic	Carles Rams	CEO; caso Story-Centric	crams@ebantic.com
Ebantic	Dani Sierra	Backend y desarrollo Story-Centric	dsierra@ebantic.com
UPV · VRAIN	Jordi Linares-Pellicer	Investigador principal del subproyecto UPV	jlinares@dsic.upv.es
UPV · VRAIN	Lucía Bernad	Gestión VRAIN (convenios, trámites)	lbernad@vrain.upv.es
UPV	Inmaculada Colmenar	Gestión I+D (contratación, presupuesto, justificación)	icolgon@upvnet.upv.es

Documento generado y mantenido por el equipo UPV·VRAIN del proyecto MedIA. Próxima revisión prevista: tras la plenaria del 29 de septiembre de 2026.
